



Programma Interreg V-A France-Italie (ALCOTRA) (2014 - 2020)

8443 RECOVALX



PROGETTO SINGOLO 8443 RECOVALX

**INTERVENTI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI SENTIERI CHE DAL
RIFUGIO GENOVA CONDUCONO AL COLLE DI FENESTRELLE ED AL
PASSO DEL BROCAN, DANNEGGIATI DALLA TEMPESTA ALEX**

Considerato che la rete stradale ed escursionistica del territorio transfrontaliero interessato dal GECT Parco Europeo Alpi Marittime Mercantour è stata gravemente danneggiata dall'evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020, denominato "Tempesta Alex".

In tale ambito il Conseil départemental des Alpes Maritimes, in qualità di capofila, e il Comune di Cuneo – Ente gestore del Parco fluviale Gesso e Stura, la Regione Liguria, l'Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, il Parc national du Mercantour, in qualità di partner, hanno presentato una proposta progettuale relativa all'obiettivo specifico 3.1. "Patrimonio naturale e culturale: incrementare il turismo sostenibile nell'area ALCOTRA" sull'Asse III "Attrattività del territorio", dal titolo: "RECOVALX - Ricostruzione e valorizzazione dei territori e delle valli colpiti dalla Tempesta Alex".

Il rilancio del turismo ha implicato necessariamente la ricostruzione dei percorsi escursionistici distrutti dall'evento estremo del 2-3 ottobre 2020. A seguito di intensi fenomeni meteorologici dell'ottobre 2020, la rete escursionistica di interesse transfrontaliero prossima al Rifugio Genova risultava ampiamente compromessa, con numerosi fenomeni di erosione del sedime che non permettono la transitabilità in sicurezza. I lavori rientrano nell'ambito degli interventi di somma urgenza richiamati nell'ordinanza del Comune di Entracque 11/2021, con stato di calamità prorogato fino al 12/10/2022 da Ordinanza commissariale n. 17/A18.00A/710 in data 22/06/2022. L'ordinanza comunale invitava l'Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime a intervenire urgentemente, e con le deroghe autorizzative previste dall'art. 163 del d.lgs. 50/2016, al ripristino della rete escursionistica.



Rilevato che lo stato di grave danneggiamento del territorio afferente all'ambito dei versanti montuosi adiacenti al Rifugio Genova causato dagli eventi alluvionali del 2-3 ottobre 2020 ha riguardato anche i sentieri escursionistici verso il Colle delle Fenestrelle e il Passo del Brocan, compromettendo pertanto la fruizione turistica dell'area ed il collegamento intervallivo tra le strutture ricettive in quota, riducendo l'appetibilità turistica del comparto transfrontaliero Marittime-

Mercantour, già gravemente colpito dalle restrizioni imposte dalla crisi sanitaria e dall'evento alluvionale.

Il progetto messo in atto dall'Ente di gestione delle Aree Protette della Alpi Marittime ha previsto quindi di intervenire sui sentieri prossimi al Rifugio Genova, come un miglioramento dell'attrattività del territorio in un'ottica di strategia transfrontaliera integrata per garantire il passaggio alla nuova programmazione 2021/2027 e per capitalizzare i risultati dei progetti in corso di realizzazione.


Rilevato che nell'ambito della WP 3 "Ripristino e miglioramento percorsi" è stata prevista l'Attività 3.1 per la realizzazione di interventi di Ricostruzione e valorizzazione dei territori e delle valli colpiti dalla Tempesta Alex.

Dato atto che nell'ambito dell'Attività 3.1 sono state previste le seguenti voci di costo:

- 3.1.1 Realizzazione interventi di ripristino dei sentieri danneggiati (categoria si spesa: "Lavori") per un importo di € 185.000,00 o.f.i;

- 3.1.2 Spese Tecniche per interventi di ripristino dei sentieri danneggiati (categoria si spesa: "Servizi") per un importo di € 25.000,00 o.f.i.

Con Determinazione Dirigenziale n. 246 del 07/06/2022 è stata affidata la progettazione e la direzione lavori al Geom. Bergese Gianluca per € 6.500,00 che a mezzo Nota Prot.4470 del 20.07.2022 ha provveduto a trasmettere la progettazione definitivo-esecutiva dei lavori di sistemazione dei sentieri che dal Rifugio Genova conducono al Colle di Fenestrelle ed al Passo del Brocan.

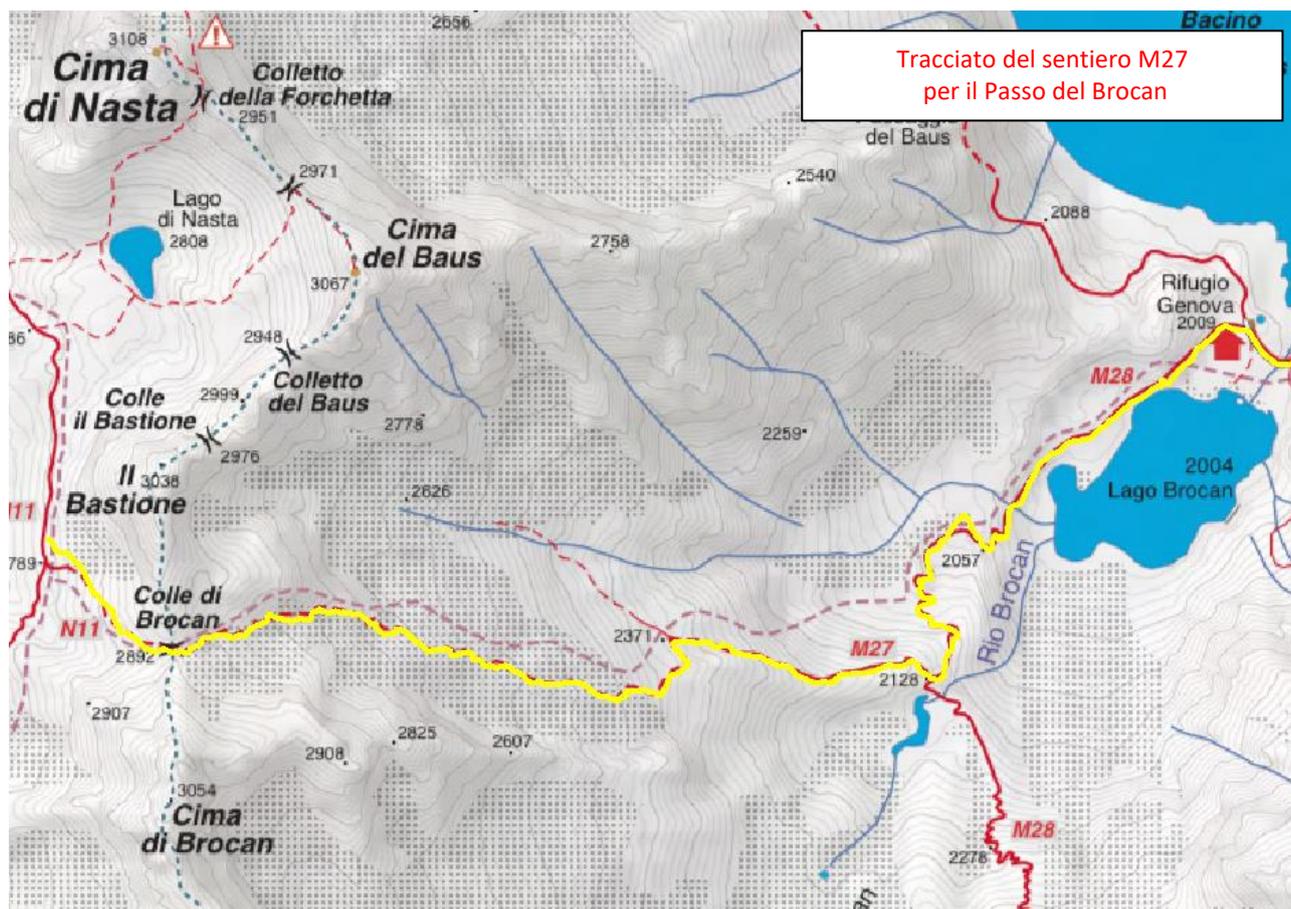

Con Determinazione Dirigenziale n. 377 del 11 agosto 2022 i suddetti lavori sono stati aggiudicati alla Ditta L'ARBOU FOURQU Società Cooperativa Agricola, con sede in Via Luigi Barale n. 102, 12018 ROCCAIONE (CN), Codice Fiscale e Partita IVA 03677480042 per € 45.095,24 + IVA 22%, per un importo complessivo a contratto di € 55.016,19.

In data 29 agosto 2022 è stata disposta la consegna dei lavori.


Gli interventi sulla sentieristica hanno interessato uno sviluppo complessivo di circa 3.000 m lungo il sentiero per il Colle di Fenestrelle, codifica escursionistica ECNAM10000, da quota 2007 a quota 2462 m s.l.m. ed una lunghezza complessiva di circa 2300 m sul sentiero per il Passo del Brocan, codifica escursionistica ECNAM27000, da quota 2056 a quota 2892 m s.l.m. (per il sentiero per il Passo del Brocam, i km di rete messi in sicurezza ammontano a complessivi 3.348 m).

In data 14 ottobre 2022 è stata certificata l'ultimazione dei lavori dal Direttore dei lavori che ha provveduto a redigere la contabilità ed il certificato di regolare esecuzione degli stessi e il certificato di pagamento per la somma di 45.095,24 IVA esclusa.

Le opere sui tracciati hanno richiesto il ripristino di alcuni tratti interferiti da sedimenti, colate detritiche, erosioni localizzate o incanalate lungo il sedime.

I lavori svolti sono stati incentrati sulla messa in sicurezza dei due tracciati, in modo particolare:

- in corrispondenza dell'attraversamento di alcuni corsi d'acqua minori;
- in tratti di passaggio su conoidi particolarmente soggetti all'azione disfacente del sedime o a causa dell'azione scavante delle precipitazioni;
- nei tratti ove sia presente una quantità eccessiva di detrito tale da rendere il cammino oltremodo difficoltoso, per il quale sia necessaria opera di spietramento;
- nelle sezioni di attraversamento di tratti in roccia (pietraia/balze o contrafforti rocciosi) dove la reperibilità del percorso si rivela dubbia o di difficile valutazione soprattutto in condizioni disagiate (neve o nebbia) situazioni che rendono scomodo il percorso obbligando gli escursionisti a lunghe deviazioni, col rischio di porsi in situazioni di pericolo ed essere vittime di incidenti.

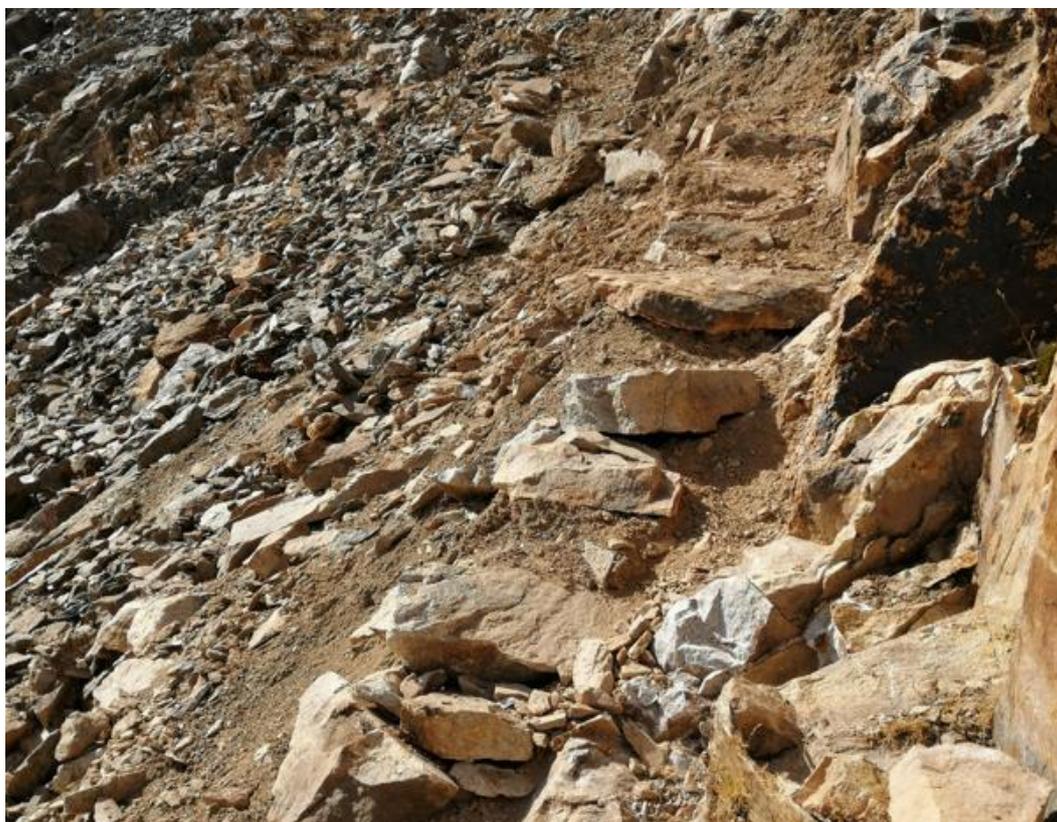

Realizzazione di pedate di scalino in tratto scosceso e detritico



Realizzazione di taglia acqua in pietra



Dettaglio di una porzione di sentiero in pietraia riprofilato




Dettaglio di un lungo tratto di sentiero ripreso con scavi manuali per adattarne le sezioni



Porzione di lastricato realizzato in zona prativa umida nei pressi del lago



Realizzazione di canaletta in pietra, taglia acqua

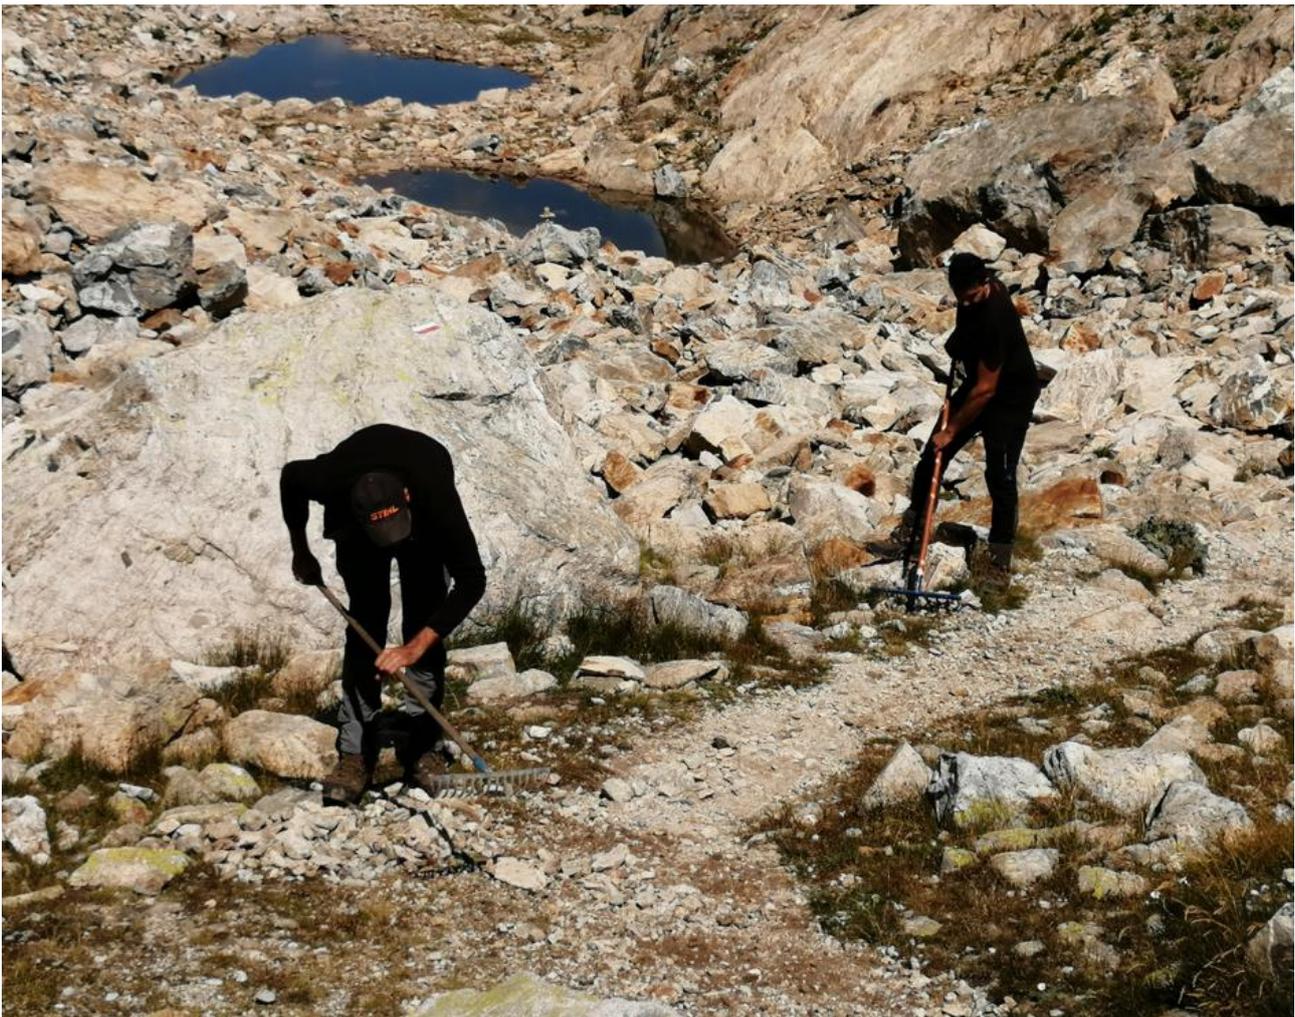

Lavoro di spietatura manuale poco a valle del Colle delle Fenestrelle
