



Interreg ALCOTRA

Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale



UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA

INDICATORI

La chiave per dimostrare il successo dei progetti e del programma

WEBINAR - 22.03.18



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Autorité de gestion / Autorità di gestione
ALCOTRA 2014-2020

SOMMARIO



Perché definire gli indicatori?



Il monitoraggio e il suo vocabolario



**Come funziona il monitoraggio?
Strumenti per i progetti**



Interreg

ALCOTRA

Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale




UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA



Perché definire gli indicatori?



LA LOGICA D'INTERVENTO PER LE POLITICHE PUBBLICHE

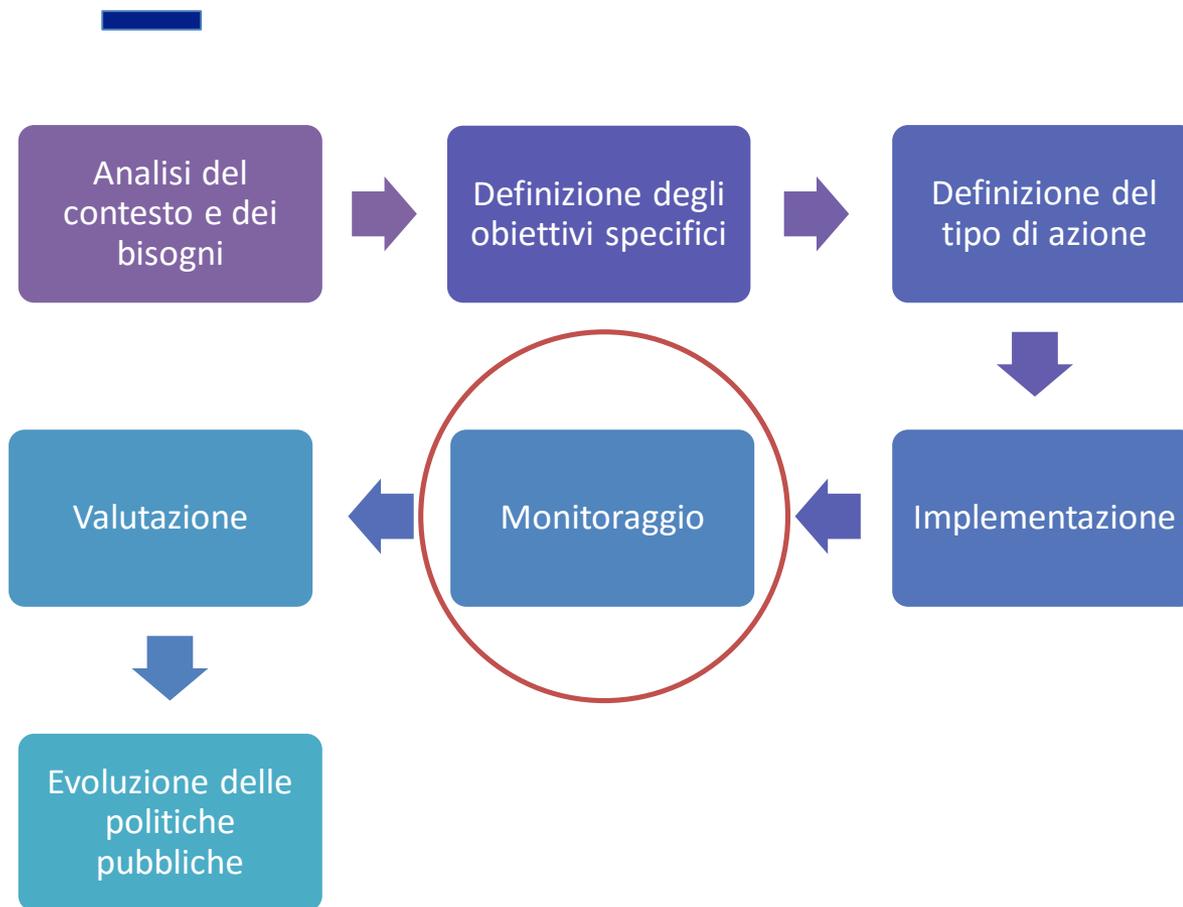



Cos'è il monitoraggio?

Definizione	Processo continuativo di raccolta e analisi di informazioni
Obiettivi	Un solido pilotaggio : <ul style="list-style-type: none">- Comparare il livello di esecuzione al livello di performance atteso- Migliorare l'azione o l'allocazione delle risorse
Fonte dei dati	Dati forniti dal sistema informativo interno al progetto (resoconto delle attività, conteggio degli output previsti, inchieste)
Effettuato da	L'équipe dedicata al progetto
Destinatario	Capofila del progetto

AINS



IL MONITORAGGIO IN ALCOTRA

MONITORAGGIO DEI PROGETTI

Permette una **comprensione dello stato di avanzamento del progetto** rispetto ai suoi obiettivi

Alimenta gli indicatori del programma nel quadro della logica di intervento

OBIETTIVO : dimostrare il successo di ogni progetto e del programma alle istanze di ALCOTRA (i cittadini, le amministrazioni partner, la Commissione Europea)




COME FUNZIONA?

Informa le istanze del programma dell'avanzamento delle attività

Raccoglie informazioni tracciate, probate e validate; segue la qualità delle realizzazioni

Beneficiari

Autorità di gestione/Segretariato



Rapporti di avanzamento

Rapporto annuale di esecuzione ALCOTRA

Indicatori progetti

Indicatori programma

MONITORAGGIO PROGETTI

MONITORAGGIO PROGRAMMA



IL MONITORAGGIO E IL SUO VOCABOLARIO



DEFINIZIONI





INDICATORI

Indicatore

Variabile che fornisce **informazioni quantitative e qualitative** su un dato fenomeno. Prevede un valore e un'unità di misura

Indicatore di realizzazione


Indicatore che descrive il prodotto fisico delle spese compiute nel progetto
=> **Misura le attività realizzate**

Indicatore di risultato

Indicatore che descrive un aspetto specifico di un risultato atteso
=> **Misura il raggiungimento del cambiamento atteso**



DUE LOGICHE PARALLELE

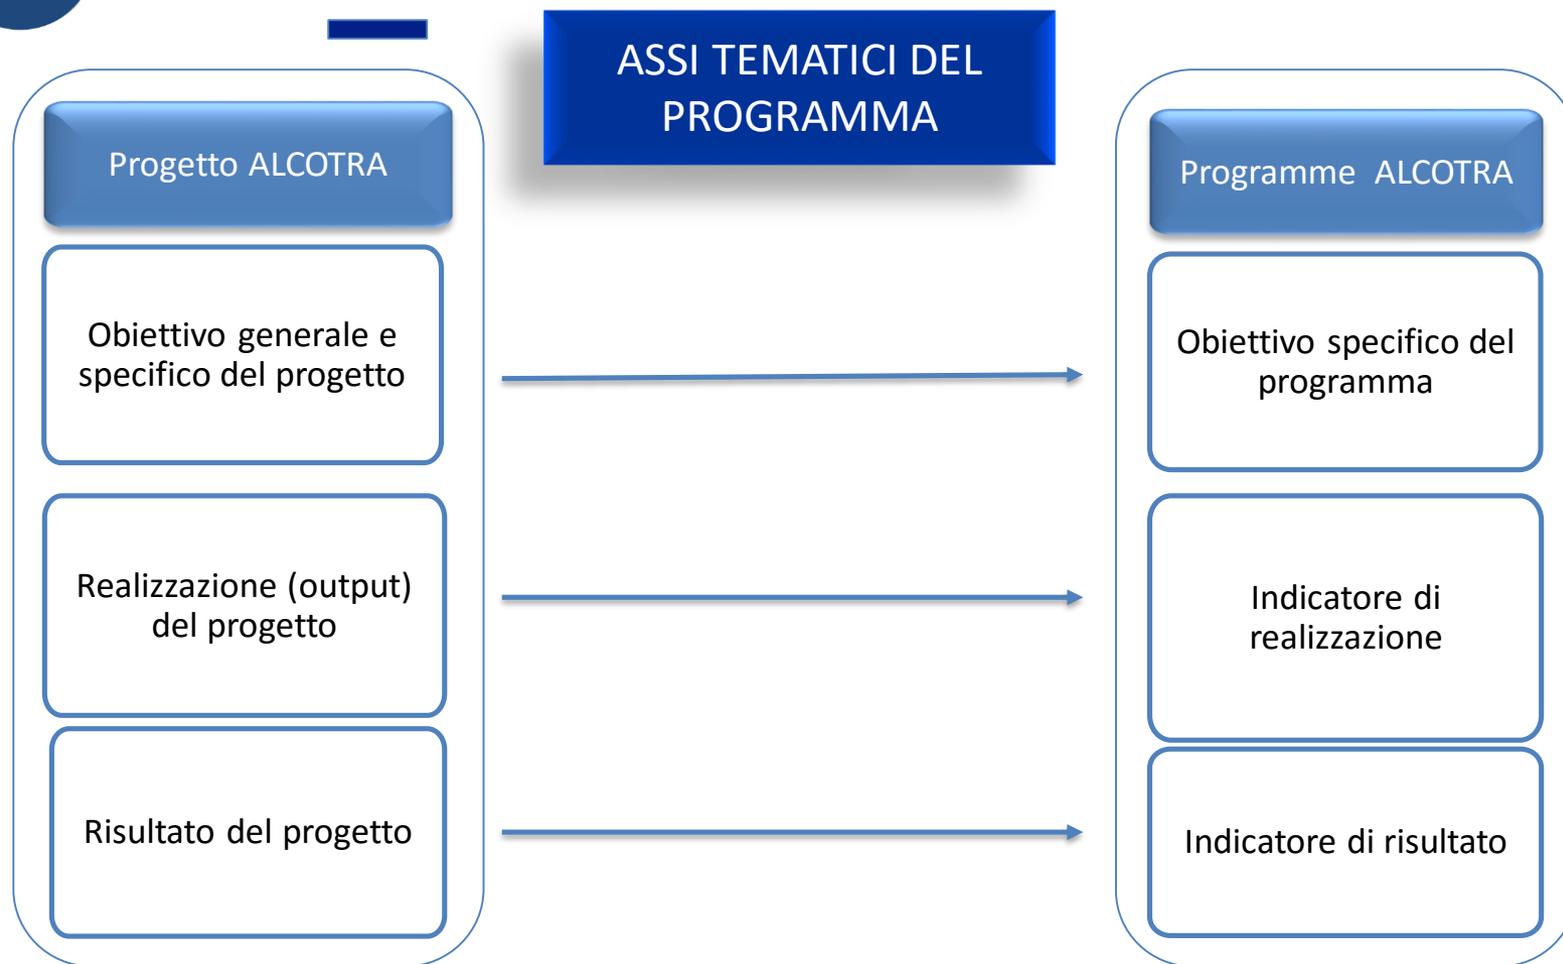

DUE LOGICHE PARALLELE

PrevRisk Haute Montagne

Aumentare la resilienza delle comunità di fronte ai rischi emergenti e specifici dell'alta montagna

1 strumentazione per un punto misura neve e monitoraggio per un anno
1 sistema di videocamere installate
→ 2

n. partecipanti a 2 formazioni per geologi, ingegneri e geometri sul permafrost
n. partecipanti agli incontri tematici tra partner in Val D'Aosta
→ 55

Asse II Obiettivo Specifico II.2

Obiettivo Specifico

Indicatore di realizzazione

N. Strumenti sviluppati per la gestione dei rischi

Indicatore di risultato

N. Persone mobilitate nelle misure di prevenzione dei rischi

Programma ALCOTRA

Aumentare la resilienza dei territori ALCOTRA più esposti ai rischi

Somma di PREVRISK e degli altri progetti sullo stesso obiettivo specifico
Valore target : 25

Somma di PREVRISK e degli altri progetti sullo stesso obiettivo specifico
Valore target: 590




ASSE 1 – INNOVAZIONE



Asse prioritario	Obiettivo specifico	Indicatori di risultato	Valore obiettivo 2023	Indicatori di realizzazione	Valore obiettivo 2023
I. INNOVAZIONE APPLICATA	I.1 Incrementare i progetti di innovazione (in particolare dei Clusters e dei poli e delle imprese) e sviluppare servizi innovativi a livello transfrontaliero	Numero di innovazioni / servizi innovanti creati	35	I.1 Numero di enti di ricerca che partecipano a progetti di ricerca transfrontalieri, transnazionali o interregionali.	127
				IC42 CTE I.1 Numero di strutture, dato dalla somma di imprese, soggetti intermedi (ad es. cluster), centri di ricerca, pubbliche amministrazioni, ecc., che partecipano ai progetti	14
	I.2 Sviluppare modelli innovativi di edilizia sostenibile negli edifici pubblici per migliorare le prestazioni energetiche	Numero di appalti che prevedono l'uso di materiali eco-sostenibili sul territorio ALCOTRA entro i due anni dalla fine dei progetti pilota	570	I.2 Numero di edifici pubblici "pilota" in cui sono utilizzati eco-materiali	5



AXE 2 – AMBIENTE SICURO



Asse prioritario	Obiettivo specifico	Indicatori di risultato	Valore obiettivo 2023	Indicatori di realizzazione	Valore obiettivo 2023
II. Ambiente sicuro	II.1 Migliorare la pianificazione territoriale da parte delle istituzioni pubbliche per l'adattamento al cambiamento climatico	Numero di istituzioni pubbliche dotate di strumenti di pianificazione territoriale che adottano strategie di adattamento al cambiamento climatico	95	II.1 Numero di strumenti sviluppati per il monitoraggio e la gestione degli impatti legati al cambiamento climatico	15
	II.2 Aumentare la resilienza dei territori ALCOTRA maggiormente esposti ai rischi	Numero di persone mobilitate nelle misure di prevenzione dei rischi	590	II.2 Numero di strumenti sviluppati (materiali ed immateriali) per la gestione dei rischi	25



ASSE 3 – ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO



Asse prioritario	Obiettivo specifico	Indicatori di risultato	Valore obiettivo 2023	Indicatori di realizzazione	Valore obiettivo 2023
III. ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO	III.1 Migliorare il turismo sostenibile nel territorio ALCOTRA	a) Numero di comuni interessati dai progetti di protezione e valorizzazione del patrimonio	226	III.1 Numero di aree, siti, itinerari recuperati e/o valorizzati	53
		b) Soddisfazione dei turisti	elevée		
	III.2 Migliorare la gestione degli habitat e delle specie protette nell'area transfrontaliera	Numero di piani d'azione condivisi a scala transfrontaliera per la conoscenza e la gestione della biodiversità	65	III.2 Numero di habitat oggetto di interventi di riqualificazione	39
	III.3 Incrementare le azioni strategiche e i piani per una mobilità nella zona transfrontaliera più efficace, diversificata e rispettosa dell'ambiente	Numero di strategie locali di mobilità sostenibile messe in atto e destinate a gruppi target specifici	21	III.3 Numero di iniziative e di servizi innovativi di mobilità sostenibile sviluppati	10



ASSE 4 – INCLUSIONE SOCIALE



Asse prioritario	Obiettivo specifico	Indicatori di risultato	Valore obiettivo 2023	Indicatori di realizzazione	Valore obiettivo 2023
IV. INCLUSIONE SOCIALE E CITTADINANZA EUROPEA	IV.1 Favorire lo sviluppo di servizi socio-sanitari per la lotta contro lo spopolamento delle aree montane e rurali	Livello di capacità degli operatori dei servizi socio-sanitari e di aiuto alla persona nell'area transfrontaliera	40% en niveau 3	IV.1 Numero di servizi ed interventi sviluppati	25
	IV.2 Aumentare l'offerta educativa e formativa e le competenze professionali transfrontaliere	Numero di corsi di formazione e percorsi «professionalizzanti» di insegnamento transfrontaliero	400	IC 46 V.2 numero di partecipanti ai programmi congiunti di istruzione e formazione a sostegno dell'occupazione giovanile, delle opportunità di istruzione superiore e professionale su scala transfrontaliera	17 139



COME FUNZIONA IL MONITORAGGIO? STRUMENTI PER I PROGETTI



I VARI RAPPORTI PREDISPOSTI DAI BENEFICIARI



**Rapporto
d'avanzamento
intermedio**

QUANDO ?

Ad ogni domanda di
acconto



**Rapporto
d'avanzamento
annuale**

QUANDO ?

Annualmente, entro
il 1^o febbraio



**Rapporto finale di
esecuzione del
progetto**

QUANDO ?

Entro 4 mesi dalla data di
conclusione del progetto



CHI? Capofila



COME? In italiano e francese



DOVE? Nel sistema Synergie CTE



Interreg
ALCOTRA

Fonds européen de développement régional
Fondo europeo di sviluppo regionale



UNION EUROPÉENNE
UNIONE EUROPEA



INDICATORI DI REALIZZAZIONE (1/4)

Dove inserire gli indicatori di realizzazione?



Sul sistema informatico SYNERGIE CTE:

Questo documento si basa sul modello seguente: Rapporto di avanzamento annuale – 2° bando 

- 1. [Gli obiettivi principali di questo documento](#)
- **I Parte A – Rapporto di attività**
 - 1. [Dati generali del rapporto di avanzamento del progetto](#)
 - 2. [Sintesi dei principali avanzamenti](#)
 - 3. [Problemi incontrati e soluzioni adottate](#)
 - 4. [Obiettivi raggiunti](#)
 - 5. [Rapporto suddiviso per Gruppi di attività](#)
 - 6. [Avanzamento delle realizzazioni principali del progetto](#)
 - 7. [Riepilogo delle realizzazioni principali del progetto](#)
 - 8. [Gruppi destinatari raggiunti](#)
- **II Parte B. Monitoraggio specifico**
 - 1. [Procedure di evidenza pubblica](#)
 - 2. [Indicatori di realizzazione](#)
 - 3. [Descrizione degli indicatori valorizzati in questo rapporto](#)
- **III ALLEGATI**
 - 1. [Allegati](#)





INDICATORI DI REALIZZAZIONE (2/4)

Come inserire i miei valori?

[Capitolo precedente](#) | [Sommarrio](#) | [Capitolo successivo](#)

Indicatori di realizzazione

Indicatori non ricollegati a un progetto

Indicatore	Unità	Previsto	Realizzato (dato cumulato)	Realizzato (2015)	Realizzato (2016)	Realizzato (2017)	Unità
Indicatori specifici dell'asse							
Numero di aree, siti, itinerari recuperati e/o valorizzati	Quantitativo	8	+				Numero

Valore target del progetto inserito al momento del deposito
Automaticamente precompilato a partire dal formulario di candidatura

Aggiungere il realizzato

Indicatori : Numero di aree, siti, itinerari recuperati e/o valorizzati

valore raggiunto : Numero

[it] Valeurs réalisées par année

2015	2016	2017
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Salva

3



INDICATORI DI REALIZZAZIONE (3/4)

Una volta inseriti gli indicatori, ecco come si visualizza il paragrafo del Rapporto:

[Capitolo precedente](#) | [Somario](#) | [Capitolo successivo](#)

Indicatori di realizzazione

Indicatori non ricollegati a un gruppo

Indicatori		Previsto	Realizzato (dato cumulato)	Realizzato (2015)	Realizzato (2016)	Realizzato (2017)	Unità
Indicatori specifici dell'asse							
Numero di aree, siti, itinerari recuperati e/o valorizzati	Quantitativo	8	2		3	4	Numero



INDICATORI DI REALIZZAZIONE (4/4)

Come giustificare i valori inseriti?

Spiegare a cosa corrisponde il valore riportato:

Descrizione degli indicatori valorizzati in questo rapporto

	Commenti
Numero di aree, siti, itinerari recuperati e/o valorizzati	 
	 

Salva



INDICATORI DI RISULTATO (1/3)

Inserire gli elementi principali

Potete creare una versione PDF del formulario di candidatura qui: 

Questo documento si basa sul modello seguente: Progetti singoli (bando 1) 

■ I Riepilogo del progetto

- ✓ 1. [Identificazione del progetto](#)
- ✓ 2. [Descrizione sintetica del progetto](#)
- ✓ 3. [Riepilogo del piano finanziario del progetto](#)
- ✓ 4. [Riepilogo dei partner del progetto](#)
- ✓ 5. [Contatto con l'animatore territoriale](#)

■ II Partner del progetto

- ✓ 1. [Partner del progetto](#)
 - ✓ 1.1 [Questionario relativo ai partner](#)
- 2. Piano finanziario del partner
 - ✓ 2.1 [Piano finanziario del partner](#)
 - ✓ 2.2 [Origine del contributo dei partner](#)
 - ✓ 2.3 [Ripartizione del budget del partner per attività / categorie di spesa \(CS\)](#)

■ III Descrizione del progetto

- 1. Contesto di riferimento del progetto
 - ✓ 1.1 [Sfide territoriali comuni : contesto e problematiche di riferimento](#)
 - ✓ 1.2 [Sfide affrontate dal progetto e approccio utilizzato](#)
 - ✓ 1.3 [Necessità della cooperazione transfrontaliera / Valore aggiunto transfrontaliero](#)
 - ✓ 1.4 [Effetto leva](#)
- 2. Obiettivo del progetto
 - ✓ 2.1 [Obiettivi, risultati attesi e principali realizzazioni del progetto](#)
 - ✓ 2.2 [Gruppi destinatari del progetto](#)
 - ✓ 2.3 [Sostenibilità delle realizzazioni e risultati del progetto](#)
 - ✓ 2.4 [Trasferibilità delle realizzazioni del progetto](#)



Nel sistema
SYNERGIE CTE:



INDICATORI DI RISULTATO (2/3)

I risultati attesi e l'indicatore di riferimento sono già inseriti nel vostro progetto:

Risultato

1 Aumentare la resilienza delle comunità rispetto ai rischi : Il risultato primario del progetto è l'aumento della resilienza delle comunità rispetto ai rischi emergenti e specifici dell'alta montagna (in particolare i rischi legati alle valanghe, al permafrost e i rischi glaciali). I risultati principali del progetto saranno: - una migliore conoscenza scientifica dei rischi emergenti, tramite una rete di dati specifici trasferibile a livello alpino; - una migliore interoperabilità dei servizi di soccorso in montagna con l'istituzionalizzazione della rete "Triangulaire du secours"; - dei modi innovativi di risposta ai rischi specifici dell'alta montagna grazie ad una migliore cultura del rischio che si appoggia sulle nuove tecnologie (social network); - un aumento delle conoscenze e competenze delle popolazioni locali e dei professionisti del turismo sui rischi dell'alta montagna, con un modello di resilienza delle comunità che permetterà lo sviluppo di una cultura del rischio e di conseguentemente una diminuzione degli incidenti e danni causati ai rischi stessi; - un aumento delle conoscenze e competenze adatte ai turisti (escursionisti e alpinisti), con una migliore presa in considerazione dei rischi e di conseguenza una diminuzione degli incidenti; - il lancio di un metodo d'informazione più pertinente e adatto ai rischi, con la formazione degli Operatori turistici, dei Giornalisti, ecc.; - una più ampia diffusione delle nuove tecnologie di comunicazione 2.0; - una sensibilizzazione del grande pubblico con delle azioni-pilota e la creazione di modelli di resilienza di comunità trasferibili (best practice).

Obiettivo del progetto

Indicatore di risultato

2.2 PREVENZIONE DEI RISCHI : aumentare la resilienza dei territori ALCOTRA maggiormente esposti ai rischi

Numero di persone attivamente coinvolte nelle misure di prevenzione dei rischi



INDICATORI DI RISULTATO (3/3)



Nel rapporto di avanzamento sarà presto disponibile (secondo semestre 2018) una **sezione specifica dedicata agli indicatori di risultato**



Quando SYNERGIE CTE sarà aggiornato, ciascun progetto potrà inserire le informazioni richieste **direttamente sul sistema informatico**



CONSIGLI UTILI (1/2)

- ➔ Essere **realisti e cauti** nella stima dei valori degli indicatori: ogni cifra deve poter essere giustificata.
- ➔ Solo le realizzazioni e i risultati **completamente raggiunti** possono essere **quantificati nell'indicatore** (le realizzazioni ancora *in corso* non vi possono essere incluse).
- ➔ Se il **valore di un indicatore rimane a « 0 »**: niente paura!



CONSIGLI UTILI (2/2)

 **Realizzazioni:** anche qualora una realizzazione non possa essere quantificata nel quadro dell'indicatore, **tutte le informazioni descrittive delle attività legate a tale realizzazione sono le benvenute.**

 **Risultati:** **non aspettate la fine del progetto** per informare il Segretariato congiunto in merito ai risultati. In effetti:

- Il processo per arrivare a conseguirli è altrettanto interessante.
- Alcuni risultati potrebbe essere conseguiti prima della fine del progetto.
- I rapporti di avanzamento servono anche per comunicare eventuali difficoltà riscontrate. Il SC è a disposizione per supportare e accompagnare i progetti.



Documenti utili

Tutti i documenti sono disponibili sul sito ALCOTRA ai seguenti link:

- Allegato III del Programma di cooperazione «**Indicatori e quadro di performance**»: http://www.interreg-alcotra.eu/sites/default/files/annexe_3_-_indicateurs_et_cadre_de_performance_-_version_decembre_2016_0.pdf
- **Rapporti annuali di esecuzione (RAE)**: <http://www.interreg-alcotra.eu/it/scopri-alcotra/funzionamento-del-programma/rapporti-e-valutazioni>
- **Guida di attuazione** – Parte IV: <http://www.interreg-alcotra.eu/it/scopri-alcotra/funzionamento-del-programma>
- **EC guidance** on monitoring and evaluation: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf

<http://interreg-alcotra.eu>



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

Autorité de gestion / Autorità di gestione
ALCOTRA 2014-2020
